


IT Projektledelse – HA(it.)

Lektion 13-16 – PERT Analysis


Netværksplanlægning - Et eksempel

		Forgængere	Estimat
A	Valg af hardware		150
B	Softwaredesign		100
C	Installer hardware	A	75
D	Kodning og test af software	B	100
E	Konverter filer fra gl. system	B	75
F	Skriv brugermanual		250
G	Brugertræning	E, F	75
H	Installér og test	C, D	50


Vi tegner netværket

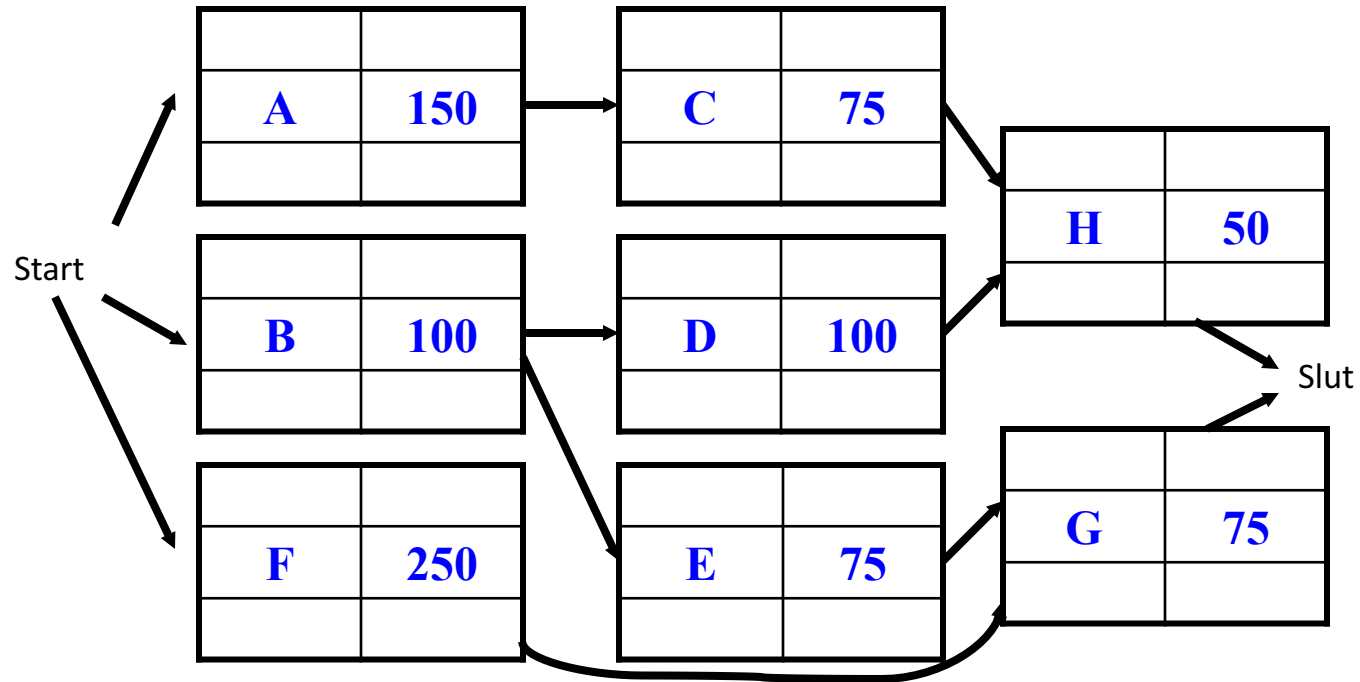


Vi regner forlæns ...

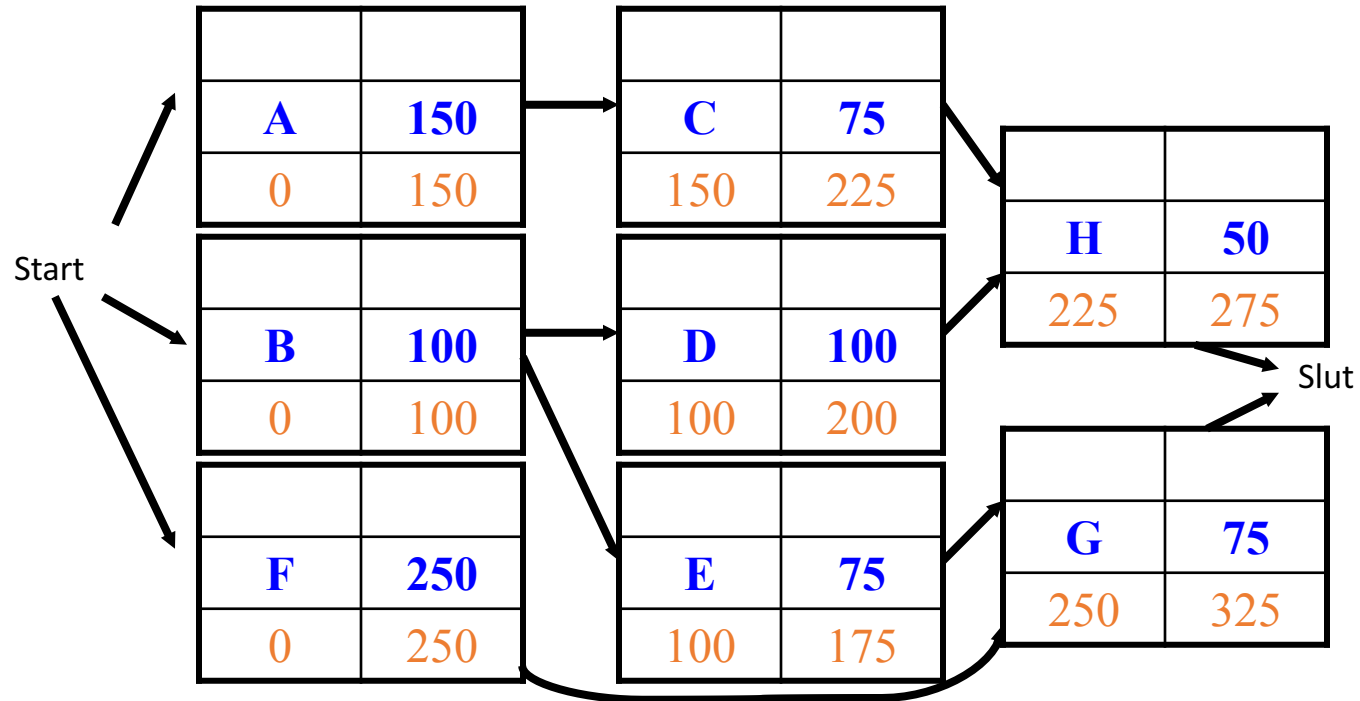

Og baglæns – startende med 325

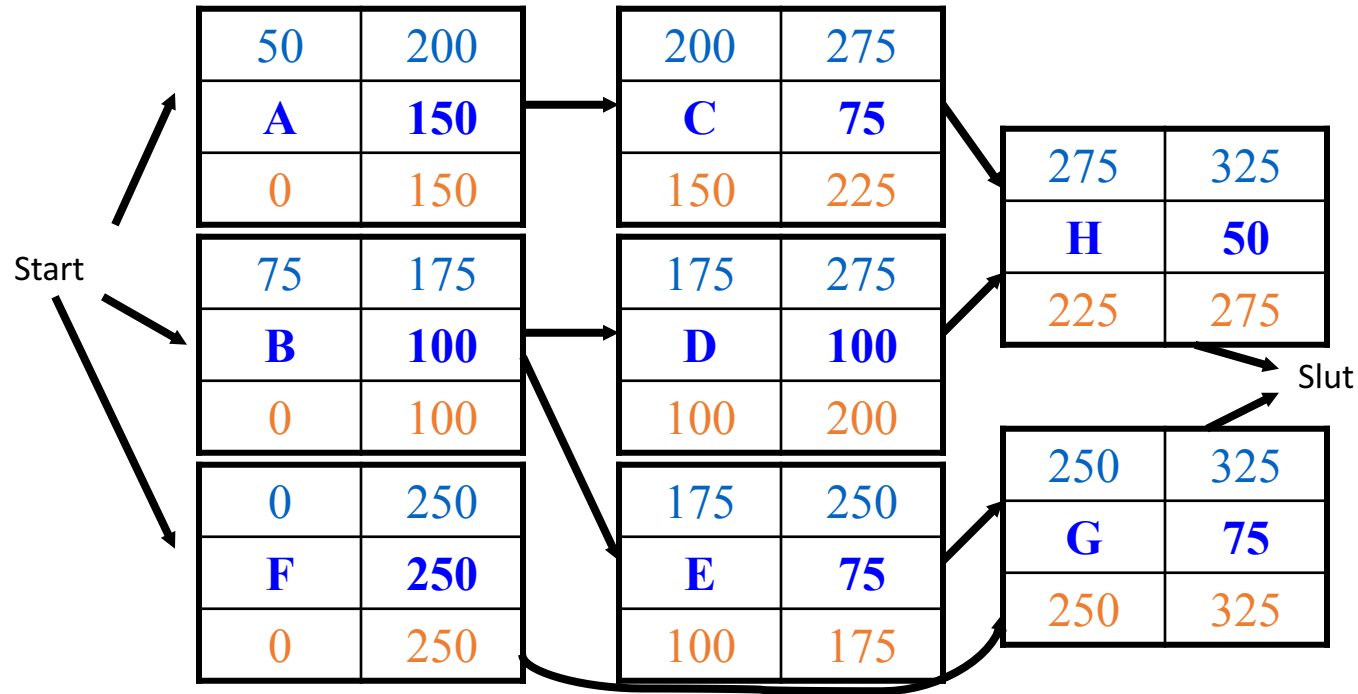


Den Kritiske Vej – Aktiviteter der hvis de forsinkes, forsinket det hele

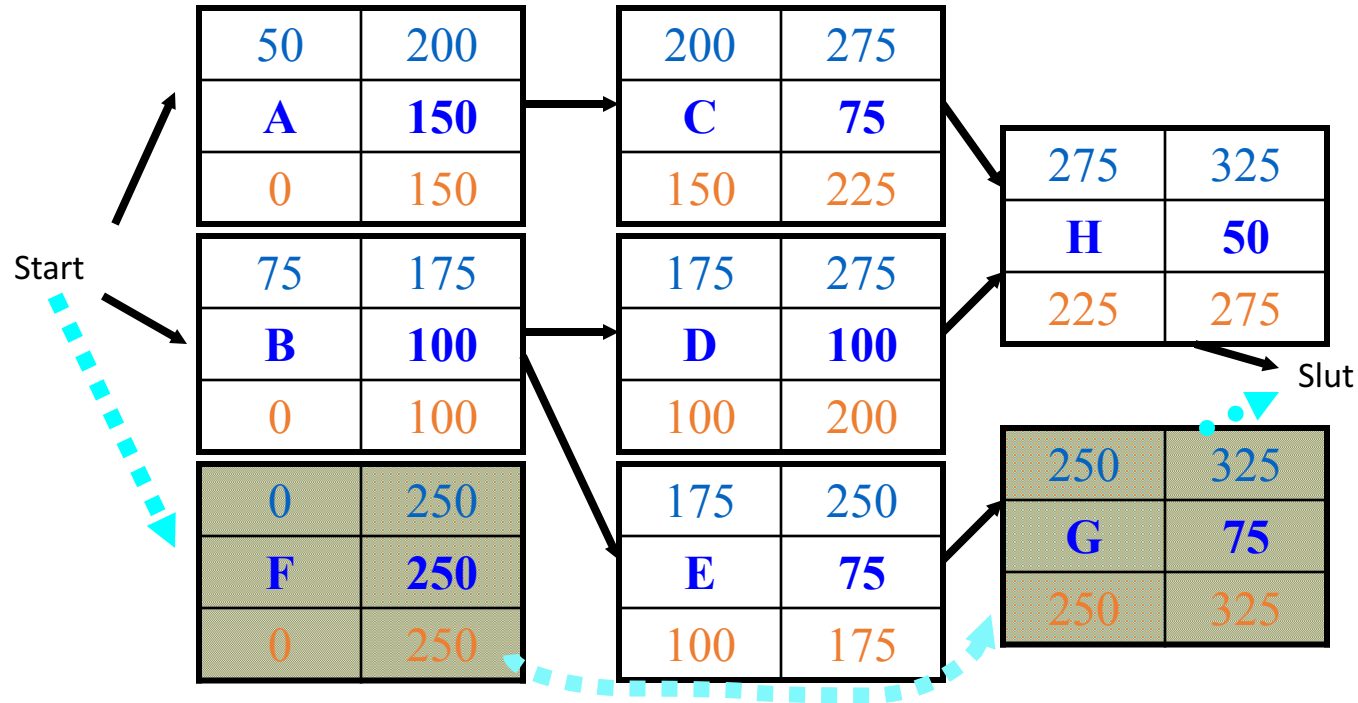


Vi får nu tildelt 3 personer

- Alle mand fuld tid = 25 effektive timer
- HANSEN er god til hardware => A og C
- JENSEN er god til software => B, D og H
- NIELSEN er brugerspecialist => F og G
- Alle kan lave E (men ingen har lyst)

Samme netværk med personer ...

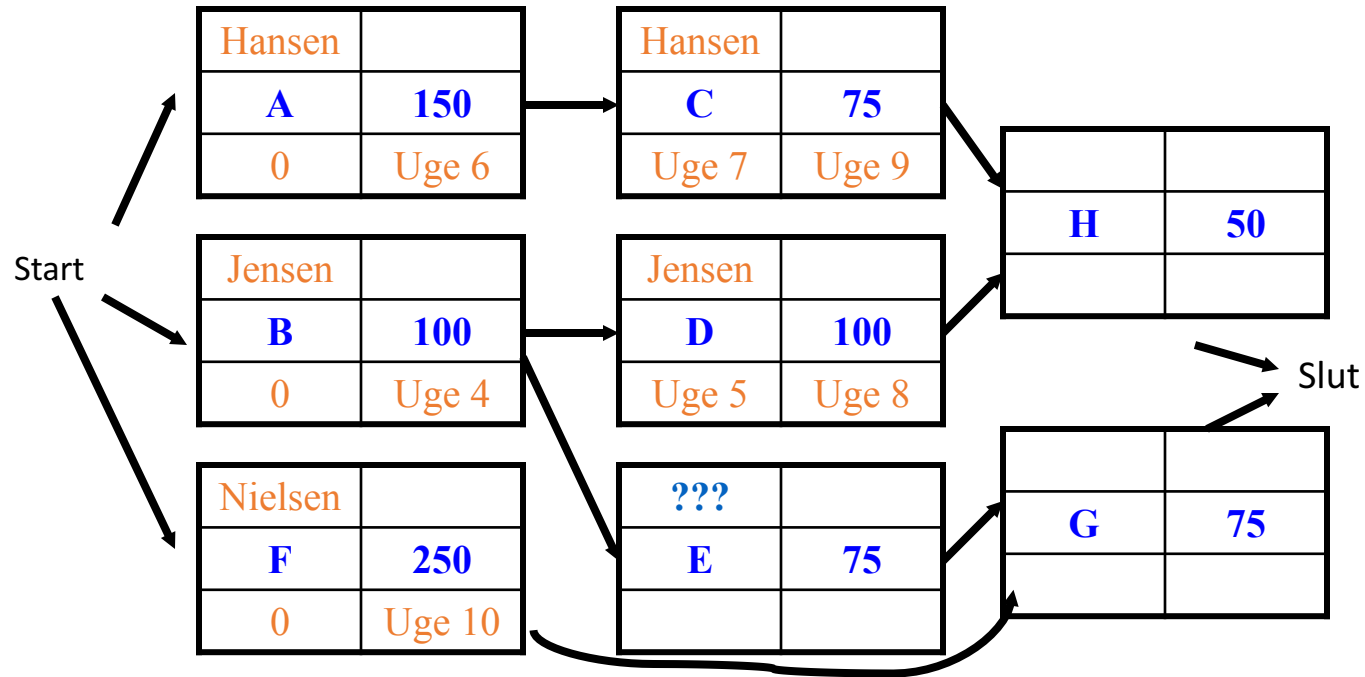

Vi fordeler "E" til Hansen og Jensen,
og bliver færdig i uge 13

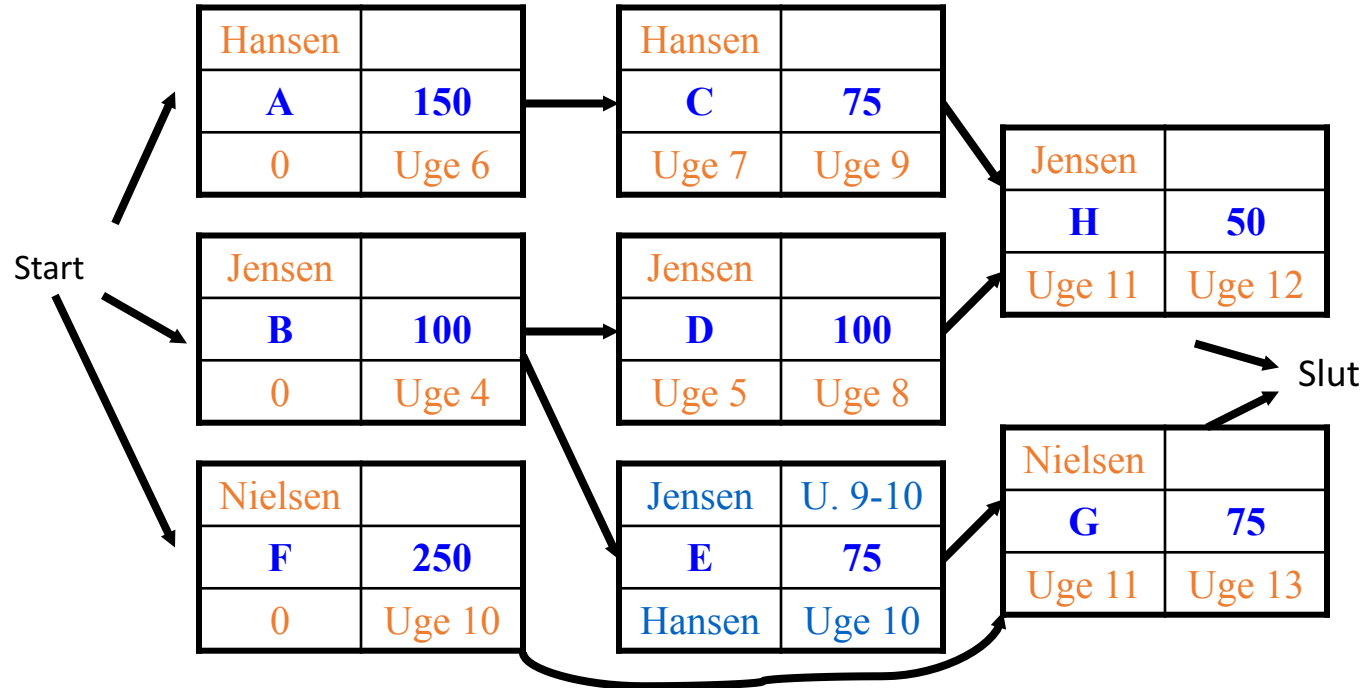


PERT

Expected times and standard deviation

Aktivitet	Optimistisk	Realistisk	Pessimistisk	Forventet	Std. afv
A	5,00	6,00	8,00	6,33	0,50
B	3,00	4,00	5,00	4,00	0,33
C	2,00	3,00	3,00	2,83	0,17
D	3,50	4,00	5,00	4,08	0,25
E	1,00	3,00	4,00	2,83	0,50
F	8,00	10,00	15,00	10,50	1,17
G	2,00	3,00	4,00	3,00	0,33
H	2,00	2,00	2,50	2,08	0,08

PERT network

Event Number	Target date
Expected date	Standard deviation

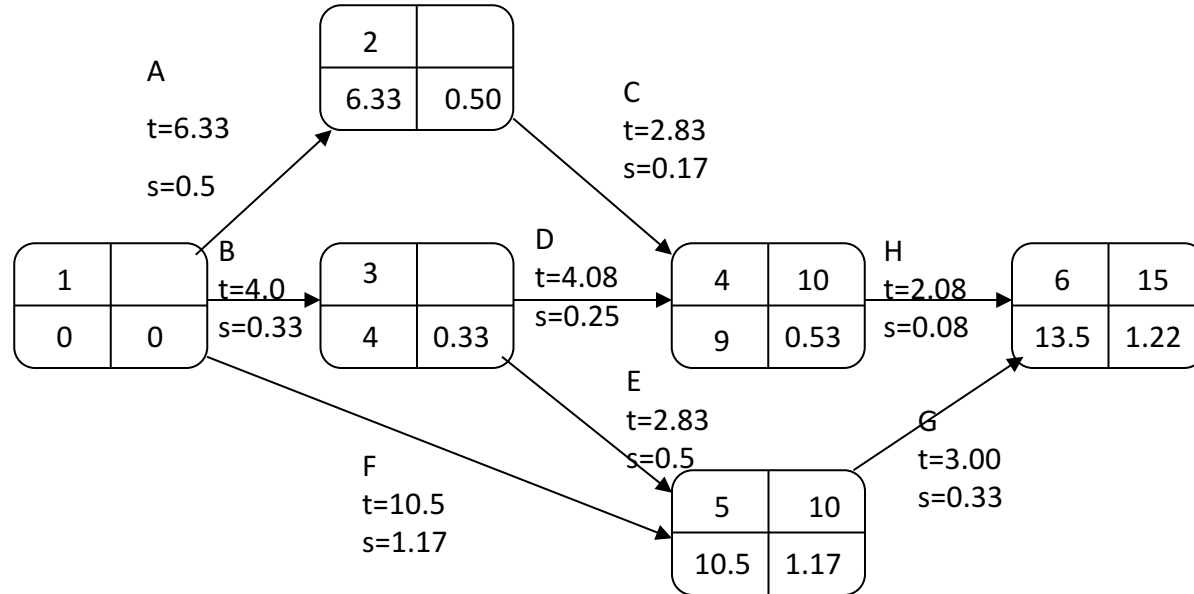



Fra estimat til plan

- Estimer i timer så der ikke opstår tvivl om, hvad man taler om. En dag kan f.eks. være alt mellem 6 og 16 timer. En uge kan være fra 30 til 100 timer osv.
- Som omregningsfaktor kan evt. anvendes, at en gennemsnitlig personmåned i Danmark omfatter 18 arbejdsdage eller 135 arbejdstimer (ved arbejdsdage på 7,5 time).

Du er ikke effektiv !

- 8 timer om dagen, 40 timer om ugen

- Effektivitetsfaktoren: Hvor meget tid arbejder hver projektdeltager effektivt på projektet. Det tager tid at læse post, deltage i afdelingsmøder, holde personalesamtale, læse fagtidsskrifter etc.
- Effektive arbejdstimer = Arbejdstimer * 70-80%
- Rådighedsfaktoren: Hvor stor en del af deres tid, de er til rådighed for projektet.

Sammenhænge

