

- Kontekstuelle tilgang
- Løst koblede tilgang
- Symbolske tilgang
- Lærende tilgang
- Systemiske tilgang
- Komplexitetstilgang

IT-PROJEKTLEDELSE

Lektion 7: Den "alternative" tilgang

8. april, 2026

- Realistiske tilgang?



www.wallpaperaccess.com

DE NÆSTE Knap 100 MINUTTER...


Lektion 7: Den "alternative" tilgang



1. Introduktion



2. Projektplaner



3. Projektstyring




4. Projektledelse



5. Afslutning

TO ~~ALTERNATIVE~~ SUPPLERENDE TILGANGE TIL PROJEKTLEDELSE

Lektion 7: Den "alternative" tilgang

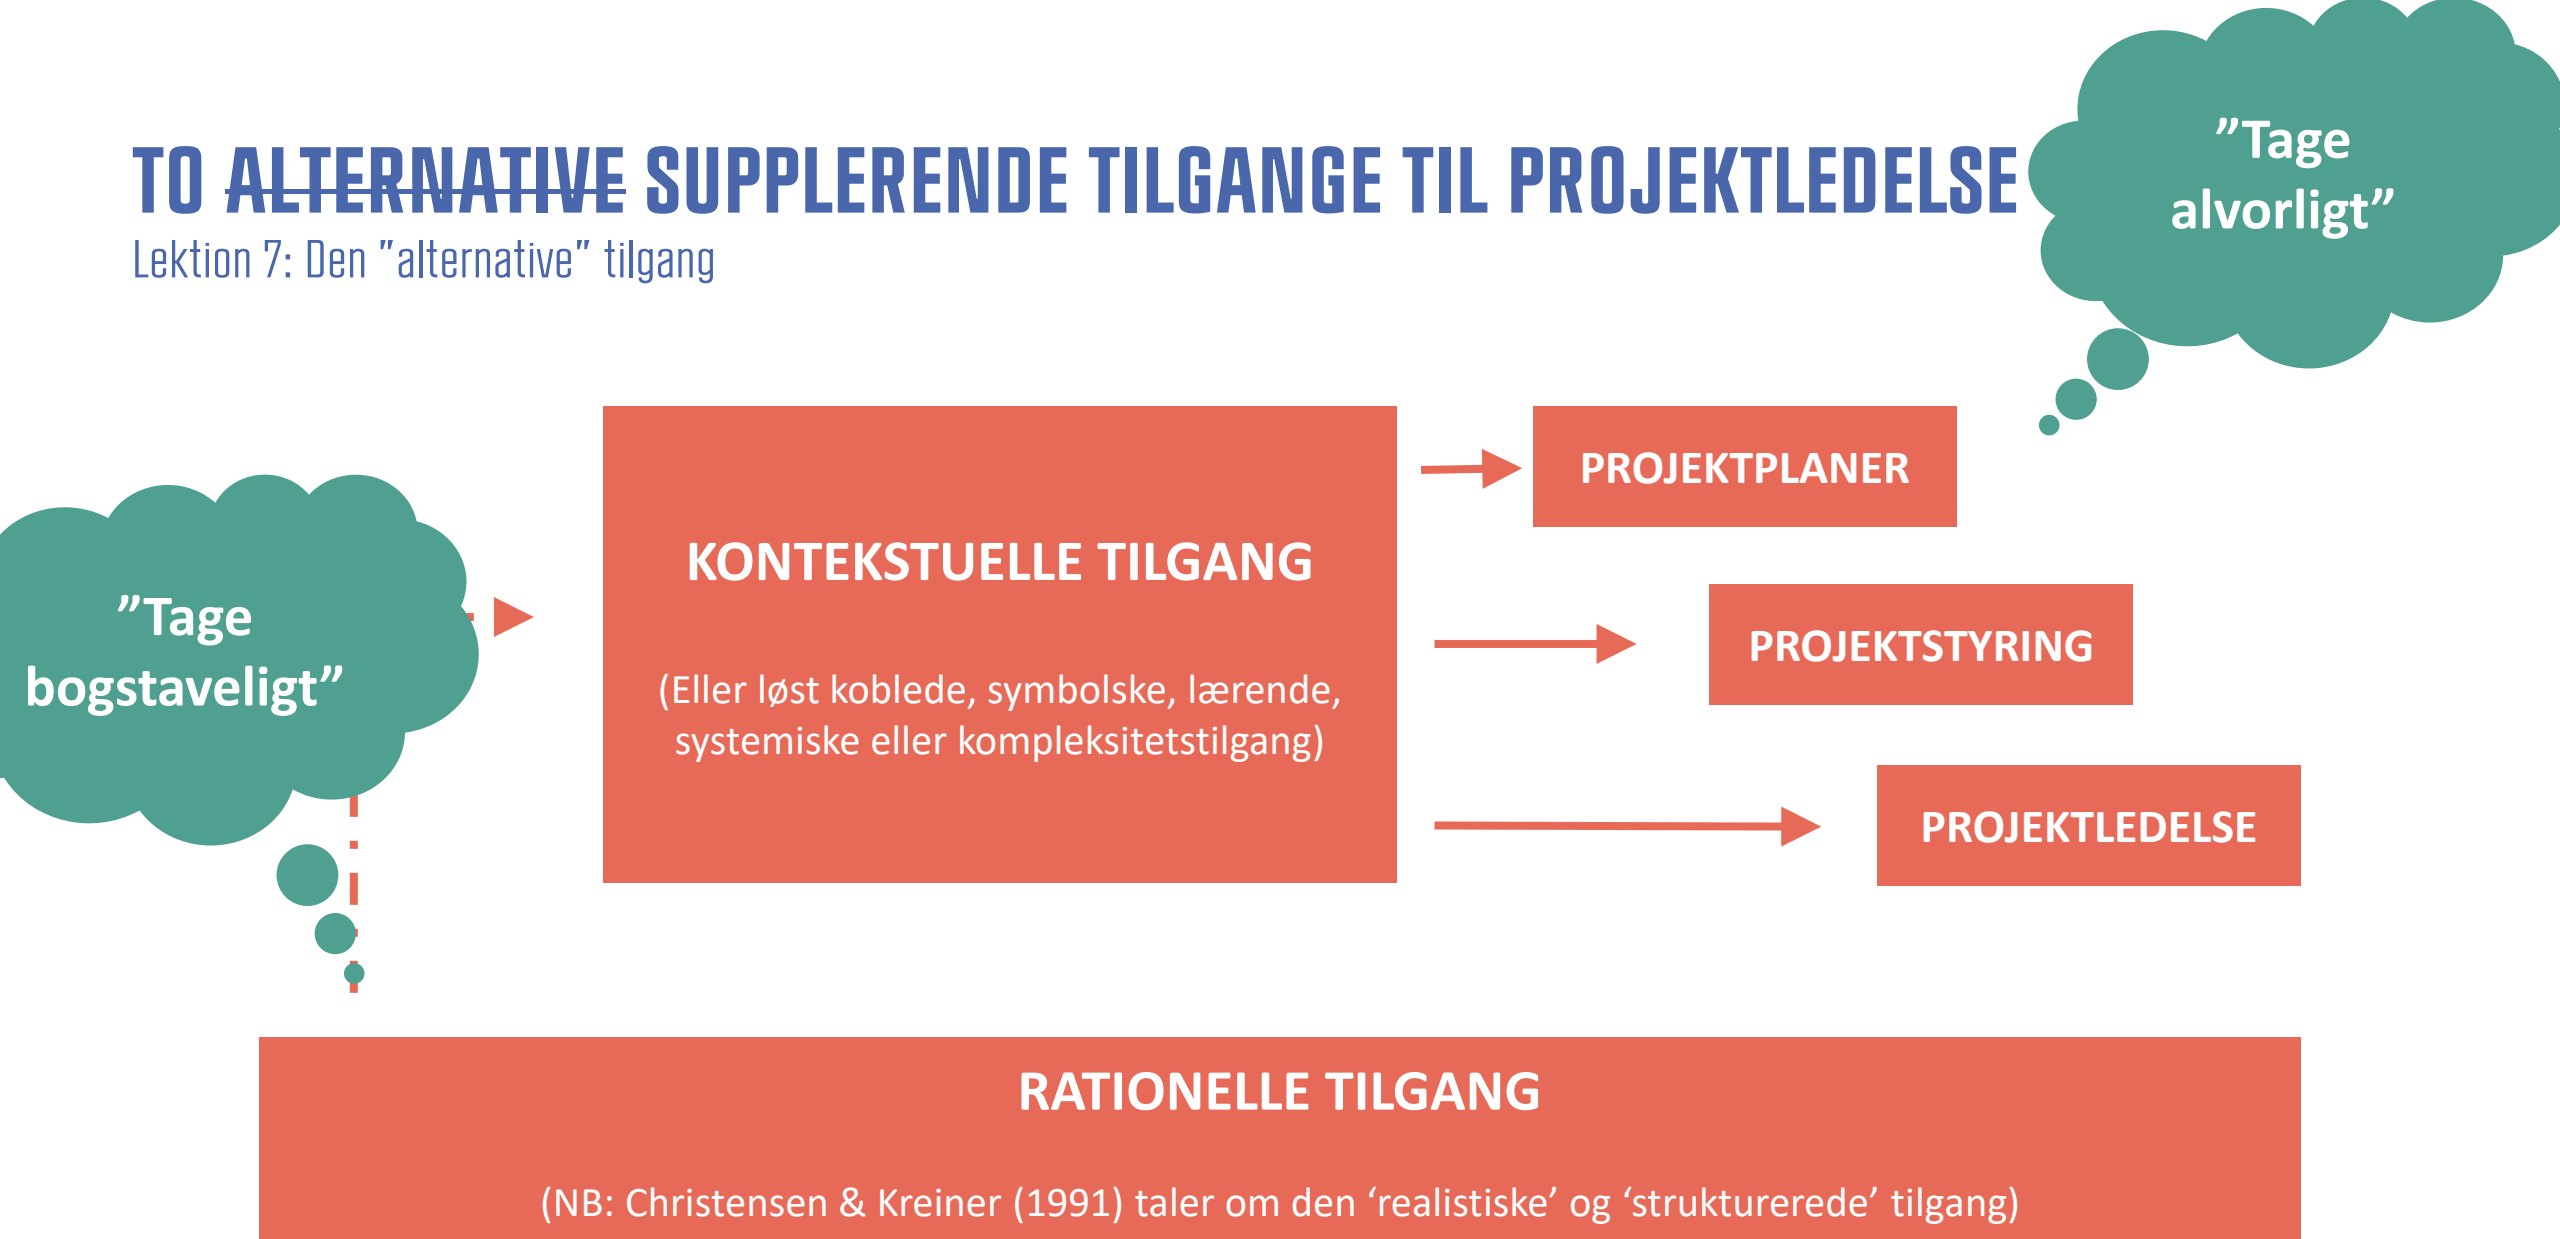

HVORFOR BEHOV FOR EN SUPPLERENDE TILGANG? OG HVORFOR SÅ SVÆRT?

Christensen & Kreiner (1991: 37pp)

OPERATIONEL USIKKERHED

”...relaterer sig til sådanne forhold, som påvirker den smertefrie, effektive gennemførelse af en given projekt-opgave...”

Udfordring: Misforhold mellem tilgængelig viden og behov for beslutninger

KONTEKSTUEL USIKKERHED

”...relaterer sig til forhold, som kan gøre projektresultatet mere eller mindre brugbart, effektivt og meningsfuldt.”

Udfordring: Faktiske resultater vurderes ofte på andet grundlag end det resultaterne blev planlagt på

2. PROJEKTPLANER

PLANLÆGNING I EN UFULDKOMMEN VERDEN

Christensen & Kreiner (1997: 64)

Eller hvordan vi
planlægger
meningsfuldt når
målsætninger er
foranderlige?

PROJEKTPLANEN SOM
'DREJEBOG' FOR
PROJEKTAKTIVITETER

(INSTRUMENTEL BETYDNING)



PROJEKTPLANEN SOM
'PLATFORM' FOR FÆLLESSKAB
OG LÆRING

(SYMBOLSK BETYDNING)

"Formsmæssigt er en plan bundet til at specificere projektets aktiviteter, deres tidsmæssige relationer og deres ressourcemæssige forudsætninger."

"[Det] drejer sig derfor ikke om, hvorvidt projektplanlægning skal laves eller ej; det drejer sig om, hvilket indhold og sigte en sådan planlægning skal gives."

“DURING MILITARY MANEUVERS IN SWITZERLAND, THE YOUNG LIEUTENANT OF A SMALL HUNGARIAN DETACHMENT IN THE ALPS SENT A RECONNAISSANCE UNIT INTO THE ICY WILDERNESS. IT BEGAN TO SNOW IMMEDIATELY, SNOWED FOR TWO DAYS, AND THE UNIT DID NOT RETURN. THE LIEUTENANT SUFFERED, FEARING THAT HE HAD DISPATCHED HIS OWN PEOPLE TO DEATH.

BUT THE THIRD DAY THE UNIT CAME BACK. WHERE HAD THEY BEEN? HOW HAVE THEY MADE THEIR WAY? YES, THEY SAID, WE CONSIDERED OURSELVES LOST AND WAITED FOR THE END. AND THEN ONE OF US FOUND A MAP IN HIS POCKET. THAT CALMED US DOWN. WE PITCHED CAMP, LASTED OUT THE SNOWSTORM, AND THEN WITH THE MAP WE DISCOVERED OUR BEARINGS. AND HERE WE ARE. THE LIEUTENANT BORROWED THIS REMARKABLE MAP AND HAD A GOOD LOOK AT IT. HE DISCOVERED TO HIS ASTONISHMENT THAT IT WAS NOT A MAP OF THE ALPS, BUT A MAP OF THE PYRENEES.”



[www. wallpaperaccess.com](http://www.wallpaperaccess.com)

PROJEKTPLANER ER STADIG PROJEKTPLANER, MEN...

- Formmæssigt ligner projektplaner hvad vi kender.
- Forskellen er formålet med planer og planlægning:
 - Planen og efterfølgende realisering er løst koblede.
 - Planen er ikke et mål i sig selv...
 - ...men et værktøj for projektdeltagerne til at kunne orientere sig, genkende udfordringer og se nye muligheder.
- Planen er en fælles vision, men dens realisering kræver medvirken og kritisk stillingtagen fra projektteamet.
- Planen er et hensigtsmæssigt udgangspunkt.

***“Plans are
nothing; planning
is everything”***

Dwight D. Eisenhower

HVORFOR DET GIVER MENING AT VÆRE UREALISTISK OPTIMISTISK

- "Man kan nå meget mere end man tror"
- "Ting tager den tid, der er afsat til dem" (Parkinson's Law)
- To antagelser:
 - Opfattes en plan som troværdig, vil mennesker anstrenge sig for at opfylde forventningerne.
 - Ingen planer er fuldt realistiske.
- Ideelt fremmes processer, som afdækker og realiserer de *faktiske* muligheder.
- Vi *planlægger urealistisk*, og forventer at kunne udrette mere end hvad der planlægningstidspunktet synes realistisk.
- Resultatet er overvejende sandsynlighed for, at planen ikke realiseres fuldt ud...
- ...men også at præstationen overstiger hvad der oprindeligt blev vurderes som realistisk.


3. PROJEKTSTYRING

HVORDAN STYRES ET PROJEKT, NÅR VI ALENE HAR EN 'PLATFORM'?

- Vanskeligt at sætte projektstyringen på formel.
- Men bør ikke være "reaktiv, styrende og kontrollerende" (Christensen & Kreiner, 1991: 73)
- Mulige nøgleelementer:
 - Betragt visioner og planer som input (fremfor som bindinger)
 - Accepter egen og andres fejlbarlighed, og ha' øje for læring.
 - Styr situationsbestemt.
 - Accepter modsætninger og forskelligheder.
 - Vær proaktiv (fremfor reaktivit).
 - Giv omverdenen opmærksomhed.

"Eagle-casen"

Ekstrem case: Kan give
inspiration og anspore
til refleksion

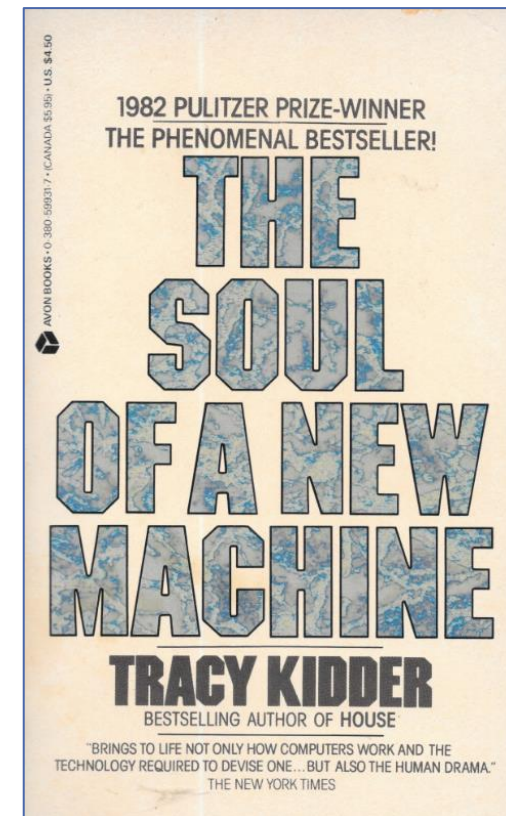


HVAD KAN VI LÆRE AF 'EAGLE-CASEN'?

Kidder (1981); Christensen & Kreiner (1991: 75-85)


1. Uformelle og/eller selvstyrende organisationsformer kan anvendes aktivt.
2. Indre motivation, læring og 'empowerment' kan drive resultater.
3. Bottom-up tilgang kan slå top-down kontrol.
4. Stærk team-identitet kan skabe fremdrift og understøtte trivsel.
5. (Teknisk) usikkerhed bør balanceres med fokus på "people management".
6. Selvstyre og høj fejl-tolerance kan skabe innovation og fremdrift.
7. Kultur og uformel kommunikation kan gøre en afgørende forskel.

Men hvor efterlader
en sådan tilgang
'moder-
organisationen' og
projektdeltagerne?



"Eagle-casen"

Ekstrem case: Kan give
inspiration og anspore
til refleksion

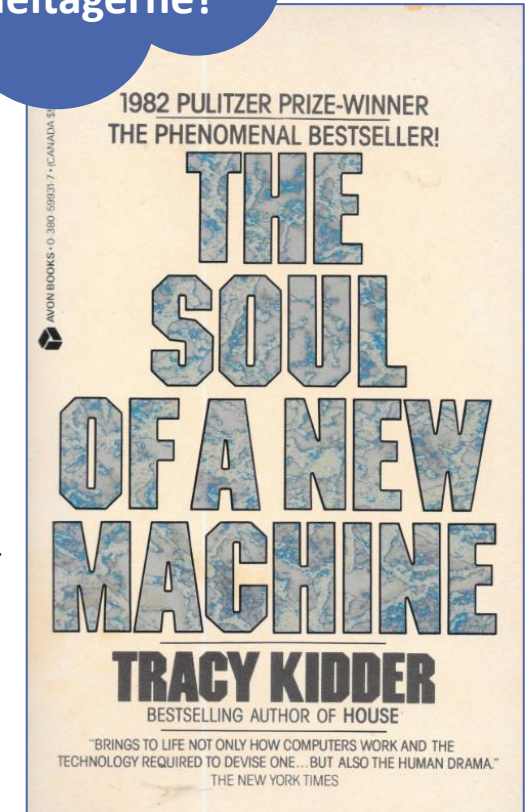

TO EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

Projekt indkøb, udvikling og idriftsættelse af Kommunernes Sygedagpengesystem (+ 100 mio. kr.)

Arbejdspakker og arbejdsapakkebeskrivelser

- Projektleder-faciliteret dialog formulerer projektets arbejdsplaner (AP)
 - Fx 'Overordnet arkitektur', 'Systemtest' og 'Kommunal implementering'.
- Beskrivelse af arbejdsplaners indhold varetages af AP-leads og godkendes af projektleder ved fase-opstart.
- Anvendelse af arbejdsapakkebeskrivelser som udtryk for kontrol eller platform for dialog og tilpasning? Andet?

Autonomi og indre motivation

- Medarbejder med ansvar for implementerings-aktiviteter returnerer fra barsel fire uger før deadline for kravspecifikation.
- Instruere i en 'do-not-rock-the-boat' tilgang til eksisterende beskrivelse og krav ang. implementering.
- Faglig stolthed driver væsentlig vækst i ambitionsniveau og i omfang af krav til implementerings-aktiviteter.
- 'Shit happens', hippie-ledelse og/eller egennytte-optimerende medarbejder? Andet?

3. PROJEKTSTYRING → **4. PROJEKTLEDELSE**

**PROJEKTLEDEREN ER " ...DEN LEDER, DER TAGER
PROJEKTET ALVORLIGT, ER PARAT TIL AT PÅTAGE SIG
ANSVARET FOR OG BESVÆRET MED AT REALISERE
PROJEKTETS ORGANISATORISKE FUNKTION, MEN SOM
YDMYGT ERKENDER SINE OG ALLE ANDRES
BEGRÆNSNINGER I FORHOLD TIL EN TURBULENT
VERDEN, SOM HELE TIDEN UNDERMINERER VÆRDIEN
AF ABSOLUTTER: ABSOLUTE PROJEKTMÅL, ABSOLUTE
PROJEKTPLANER, ABSOLUTE HOLDNINGER OG
BESLUTNINGER, OG ABSOLUTE NORMER OG ETISKE
STANDARDE."**

CHRISTENSEN & KREINER 1991: 112)


“DET ER VANSKELIGT FOR MANGE LEDERE AT ARBEJDE MED SELV-ORGANISERENDE PROCESSER, FORDI DE ER VANT TIL AT TÆNKE PÅ SIG SELV SOM NOGEN, DER HAR KONTROL, REALISERER PLANER OG SKABER FREMTIDEN [...] SNARERE END BLOT SOM DELTAGERE MED ANDRE I EN PROCES, DER UDVIKLER SIG.”

SHAW (2002)

KORT OM PROJEKMLEDELSE

Udgangspunktet for projektledelse

- Projekter er ofte præget af uhensigtsmæssige (eksterne) bindinger i form af manglende ressourcer, kvalifikationer mv.
- Projektteams er foranderlige, kan være uden klare grænser, og er ofte geografisk spredte.
- Ingen (projekt)ledere er perfekte.

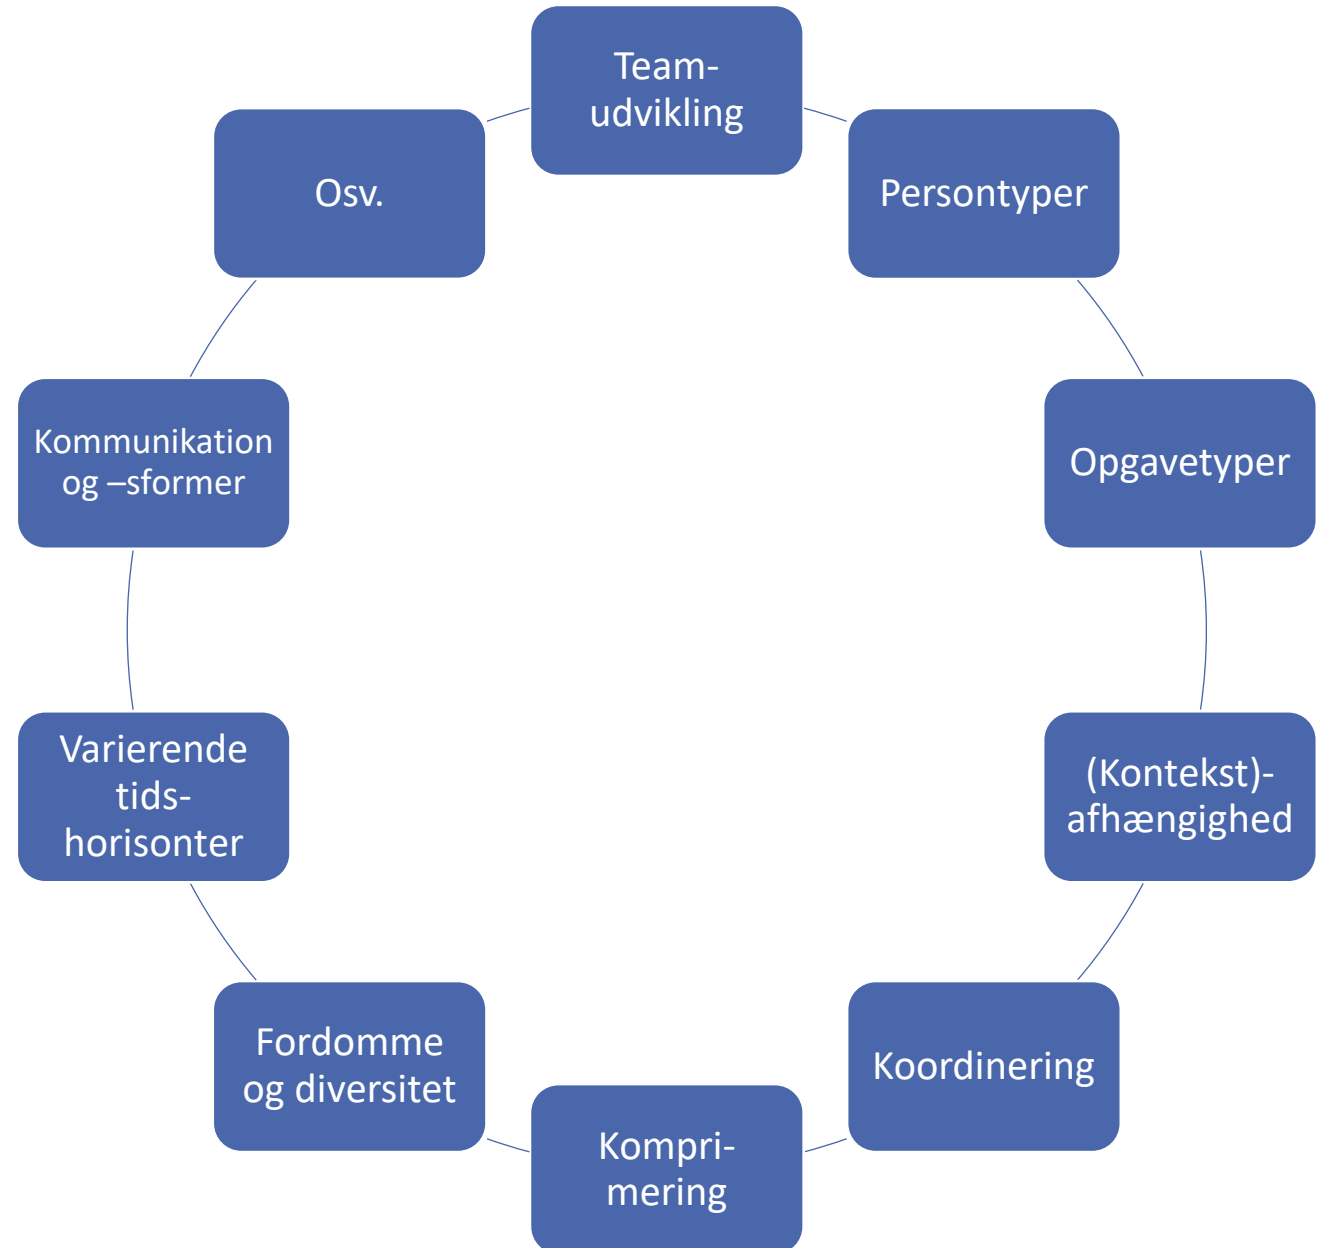

5. AFSLUTNING

OPSAMLING

Christensens og Kreiners (1991) "10 kætterske råd"

1. Skab forankring for projektet i en vision...
2. Gør ikke vold på deltagernes egne virkeligheder....
3. Justér projektmålet til situationen – hele tiden
4. Brug projektplanerne strategisk...
5. Stil urimelige krav...
6. Vær tilstede, men ikke til rådighed
7. Frygt ikke kaos og forvirring
8. Del projektets succes med deltagerne...
9. Definér projektets grænser efter omstændighederne
10. Du har ansvaret for ...sjældent magten til ...



[www. wallpaperaccess.com](http://www.wallpaperaccess.com)
