

IT-PROJEKTLEDELSE

Lektion 8: Spørgetime (online)

28. april, 2026



I DAG

EKSAMENSOPGAVE & EKSAMEN

SPØRGSMÅL TIL PENSUM

2. EKSAMENSOPGAVE & EKSAMEN

EKSAMENSOPGAVEN (1)

Formalia

Eksamensopgave HA(IT) – IT Projektledelse – 2.semester 2026

Projektledelse af semesterprojekt, 'Programmering og udvikling af systemer'

Eksamensopgave HA(IT) – IT Projektledelse

1

Forord

Denne opgavebeskrivelse er udarbejdet af Jacob Nørkjær (IT Projektledelse) i samarbejde med Ole Torp Lassen (Programmering) til brug ved eksamen i IT Projektledelsesfaget på 2. semester af HA(IT) studiet.

Jeres casebeskrivelse i programmering udgør grundlaget for denne opgave.

De beskrevne rammer i dette dokument, er kun til brug i IT Projektledelsesfaget.

Da projektet løber over hele semesteret, kan der komme mindre tilføjelser undervejs til projektet.

Eksamen i IT Projektledelsesfaget

Der henvises til kursus kataloget

Formelle krav til besvarelsen

Der henvises til formalia på my.cbs.dk og i kursusbeskrivelsen.

2

Indledning

IT Projektledelsesopgaven deles op i fire mindre del-leverancer:

1. Projektbeskrivelse
2. Projektplan
3. Kravspecifikation & Arkitektur
4. Procesevaluering

Ved besvarelsen af opgaven tager I udgangspunkt i teori, data og eksempler fra pensum, eventuelt suppleret med andre umiddelbart tilgængelige informationer.

Opgavebesvarelsen fordrer at I foretager relevante antagelser og evt. finder relevante data. I bedes redegøre herfor, f.eks. hvilke yderligere data, der er behov for i besvarelsen af jeres opgave.

Til orientering er der 2 klyngevejledninger undervejs i forløbet for de tre første delleverancer. Inden klyngevejledning uploader I jeres materiale. Aflevering til klyngevejledning sker via assignment i Canvas. Husk at tilmelde jeres gruppe under IT Projektledelse. Grupper, F26

Information om forløb af klyngevejledning og datoer herfor følger på Canvas og ved undervisningen.

Udkast til Projektbeskrivelse og Projektplan skal afleveres 26. februar med klyngevejledning 3. marts.

Datoen for aflevering af udkast til Kravspecifikation & oplysnes senere.

Opgaven IT Projektledelsesopdrag for "Programmering og udvikling af system"

IT Projektledelsesopdrag tager afsæt i programmeringsopgaven fra Programmeringsfaget, hvor I skal udvikle en applikation.

I er en gruppe studerende, der investorer i fast ejendom og I har fået en ide til en web-applikation, der kan hjælpe med beslutninger om investeringsmuligheder. I vil ikke kun udvikle til jer selv, men vil på sigt skabe en løsning, der kan bruges af andre, der overvejer at gå ind i ejendomsmarkedet. Mod betaling naturligvis, så I også kan tjene penge på jeres innovative ide.

Kravene til applikationen er i så heldige at kunne finde i jeres programmerings-opgave for programmeringsfaget. *

I har fundet en investor til projektet, som gerne vil se, hvordan jeres løsningsforslag eventuelt kan kommercialiseres. Det betyder, at investor sætter krav til jeres håndtering af projektet fremadrettet. Investor vil lægge vægt på følgende:

3

EKSAMENSOPGAVEN (2)

Hvad I bliver bedt om

- en stillingtagen til de økonomiske konsekvenser ved implementeringen af jeres løsning i form af en cost/benefit analyse med tilhørende cash flow vurdering.
- en redegørelse for jeres proces og valg af selve procesmodellen, interessenthåndtering, risikostyring og projektplan for udvikling og implementering
- at dokumentationen af jeres løsningsforslag/produkt formaliseres i form af en kravspecifikation med tilhørende arkitekturbeskrivelse.

Årsagen til disse krav er, at Investor ønsker at vurdere jeres forslag i forhold til andre potentielle projekter til sin investeringsportefølje. Investor forventer, at I leder udviklingen af projektet professionelt, og herunder involverer Investor i processen. Til dette formål er der nedsat en projektstyringsgruppe, der løbende skal vurdere jeres fremdrift og delresultater. Samarbejdet med Investor er istandsat med CBS, hvilket betyder, at jeres gruppe først og fremmest skal opfylde CBS' retningslinjer for aflevering af eksamensopgave, men også tilgode Investor's behov for en god løsning. Investor har i samarbejde med CBS bevilget hver person i gruppen et budget på maksimalt 75 persontimer til at løse IT projektløsløssopgaven.

Investor har sponsoreret, at projektgruppen kan modtage faglig gruppefeedback i IT projektløsløssedelen to 2 gange i plenum i form af klyngevejledning under den forudsætning, at gruppen afleverer et udkast til tiden.

I skal sammensætte et team og styre projektet, så I når jeres mål og ambition inden for de givne rammer. I skal udvikle prototyper til it-system, beskrive fremdriften og hvilke problemstillinger I møder undervejs – og endnu vigtigere beskrive, hvordan I løste de problemstillinger I mødte og evaluere processen ved projektafslutning – hvad gik godt og hvad gik mindre godt.

Deadline for aflevering fremgår af Digital Eksamen. Husk at I skal tilmelde jeres gruppe til Digital Eksamen. Se nærmere på myCBS.dk

Materiale og gode råd

Som baggrund for at gennemføre opgaven anvendes denne opgavebeskrivelse samt fagets pensum. I kan derudover søge oplysninger i andre offentligt tilgængelige kilder (husk at angive kilde).

Der opfordres til, at I benytter forløbets forskellige muligheder for at diskutere projektet og de problemstillinger I møder undervejs. Mulighederne er forelæsnings, klyngevejledninger og workshop. Det er et tilbud at delaflevere til vejledning undervejs i forløbet. Vejledningen giver jer en mulighed for at få feedback på den endelige eksamensopgave, som I skal aflevere. Projektet løber over hele semesteret og for at gøre det så virkelighedsnært som muligt, kan I forvente, at der kan komme tilføjelser til de endelige krav til opgavebesvarelsen. Gruppen kan med stor fordel vælge, at hver enkelt person registrerer tidsforbrug i projektet.

Rapporten

I nærværende eksamensopgave er der beskrevet forskellige aktiviteter, som det forventes, at jeres gruppe tager højde for i den endelige rapport. Nogle aktiviteter er specifikt forbundet med

processen, hvor andre aktiviteter er forbundet med rapporten. Det kan være svært at adskille processen fra produktet, idet processen afleder produktet. Kravet til jeres endelige IT projektløsløssopgave er, at det er et produkt af jeres proces.

Nedenstående er minimumskravene listet til de enkelte del-leverancer:

Projektkravet indeholder en **cost/benefit analyse** af løsningen og en stillingtagen til, hvilke dele og funktioner I vil inkorporere i projektet. Det vil sige en økonomisk analyse af de dele, I vælger at tage med i projektet. En **risikoanalyse** af projektet samt en stillingtagen til projektets **interessenter** indgår også i projektkravet. I projektkravet skal I også tage stilling til jeres **procesmodel** til gennemførelsen af hele projektet.

Projektplanen vil være en plan, hvor den enkelte aktivitet under **en milepæl** specificeres. Det skal være muligt for læserne at identificere **den kritiske vej** herunder hvilke **afhængigheder**, der måtte være i projektet. Desuden er det meget vigtigt, at projektplanen **afspejler hvilken procesmodel** I har valgt at benytte til udvikling af jeres løsning. I tæt kobling til projektplanen er det også vigtigt, at I har fokus på jeres **estimeret**.

Kravspecifikationen & arkitekturen er det endelige produkt, der leder op til den mere datalogiske del af projektet. I skal beskrive systemet og **systemets funktioner** samt hvilke **tekniske krav** der er til systemet og ikke mindst, **hvordan disse krav opfyldes**. I kan med fordel benytte "use cases" til denne beskrivelse.

Procesevalueringen er til formål, at I forklarer jeres læring i forløbet. Her skal I dels diskutere, hvordan der er arbejdet med at **etablere fælles mål** i projektgruppen; samt hvordan der er arbejdet med at fastholde alle gruppemedlemmers **motivation**. Derudover kan I beskrive 3-5 **hændelser** der er opstået undervejs i jeres projektforsøg og **hvordan I valgte at løse disse hændelser** metodisk.

EKSAMENSOPGAVEN (2)

Hvad I bliver bedt om

- en stillingtagen til de økonomiske konsekvenser ved implementeringen af jeres løsning i form af en cost/benefit analyse med tilhørende cash flow vurdering.
- en redegørelse for jeres proces og valg af selve procesmodellen, interessenthåndtering, risikostyring og projektplan for udvikling og implementering
- at dokumentationen af jeres løsningsforslag/produkt formaliseres i form af en kravspecifikation med tilhørende arkitekturbeskrivelse.

Årsagen til disse krav er, at Investor ønsker at vurdere jeres forslag i forhold til andre potentielle projekter til sin investeringsportefølje. Investor forventer, at I leder udviklingen af projektet professionelt, og herunder involverer Investor i processen. Til dette formål er der nedsat en

Gode råd

- Vær præcise og omhyggelige (😊).
- Prioriter dybde fremfor bredde.
- Respekter længdekravet (max. 30 normalsider).
- Stå gerne ved eventuel tvivl og diskuter åbenlys kritik af jeres tanker.
- Hvis relevant, angiv systematiske referencer og indsæt kildeliste baseret på fx APA7.
- Ta' ejerskab til eventuel anvendelse af generativ AI (Microsoft Copilot osv.) og følg CBS' regler.

komme tilføjelser til de endelige krav til opgavebesvarelsen. Gruppen kan med stor fordel vælge, at hver enkelt person registrerer tidsforbrug i projektet.

Rapporten

I nærværende eksamensopgave er der beskrevet forskellige aktiviteter, som det forventes, at jeres gruppe tager højde for i den endelige rapport. Nogle aktiviteter er specifikt forbundet med

processen, hvor andre aktiviteter er forbundet med rapporten. Det kan være svært at adskille processen fra produktet, idet processen afleder produktet. Kravet til jeres endelige IT projektløsningsopgave er, at det er et produkt af jeres proces.

Nedenstående er minimumskravene listet til de enkelte del-leverancer:

Projektbeskrivelsen indeholder en **cost/benefit analyse** af løsningen og en stillingtagen til, hvilke dele og funktioner I vil inkorporere i projektet. Det vil sige en økonomisk analyse af de dele, I vælger at tage med i projektet. En **risikostyring** af projektet samt en stillingtagen til projektets interesser indgår også i projektbeskrivelsen. I projektbeskrivelsen skal I også tage stilling til jeres **procesmodel** til gennemførelsen af hele projektet.


Den enkelte aktivitet under **en milepæl** specificeres. Det skal være en **kritisk vej** herunder hvilke **afhængigheder**, der måtte være. Det er vigtigt, at projektplanen **afspejler hvilken procesmodel** I har valgt. En tæt kobling til projektplanen er det også vigtigt, at I har

et endeligt produkt, der leder op til den mere datalogiske systemets funktioner samt hvilke **tekniske krav** der er til opfyldes. I kan med fordel benytte "use cases" til denne

er jeres læring i forløbet. Her skal I dels diskutere, **blive fælles mål** i projektgruppen; samt hvordan der er **medlemsmotivation**. Derudover kan I beskrive 3-5 projektfaser og **hvordan I valgte at løse disse handlinger**

INFORMAL QUALITY CRITERIA FOR EXAM PAPERS


Rienecker & Jørgensen (ed.), 2022

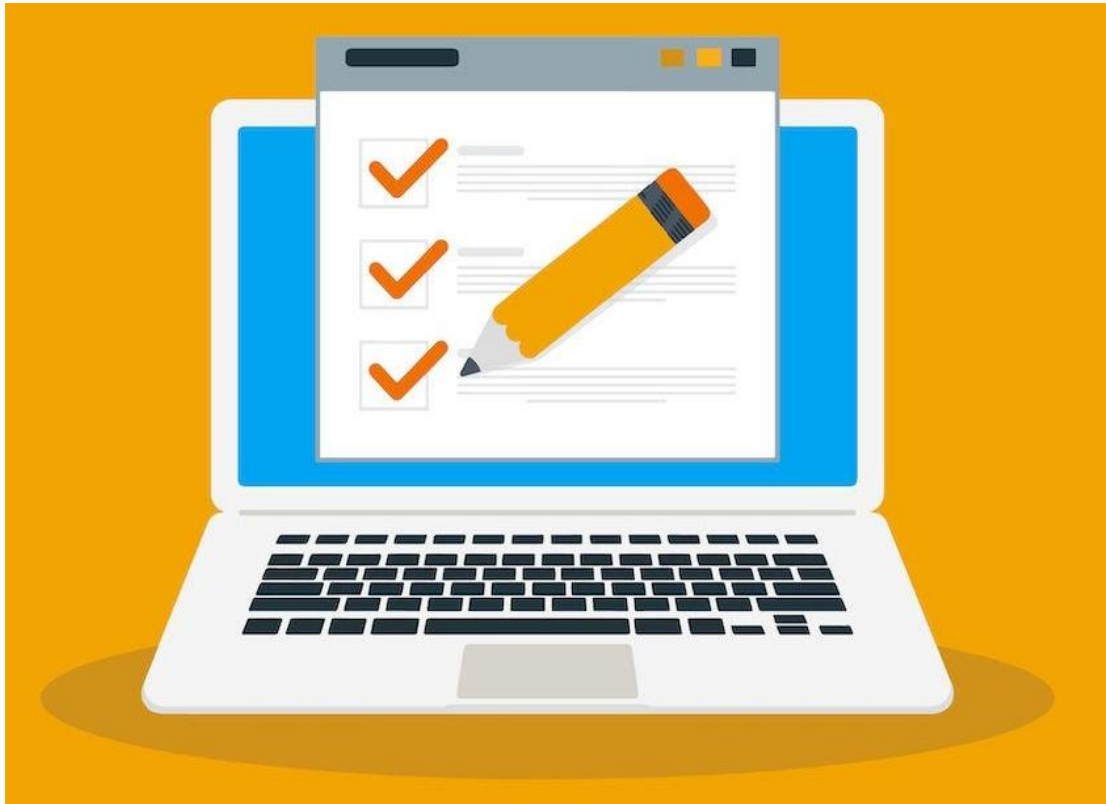

[www. medium.com](https://www.medium.com)

- ❑ It shows that the author masters the learning objectives of the course.
- ❑ It presents the author(s) as an independent, authoritative voice on the topic.
- ❑ It employs relevant material, concepts or theoretical frameworks from the course.
- ❑ It has a clear focus including relevant limitations.
- ❑ It contains one, overall, convincing argument.
- ❑ It is critical in its approach (e.g., discusses advantages and limitations in the analysis).
- ❑ It illustrates the student is able not only to present and explain, but also to apply, discuss and reflect.
- ❑ It contains a certain element of “meta communication” (e.g., what happens next).

EKSAMEN

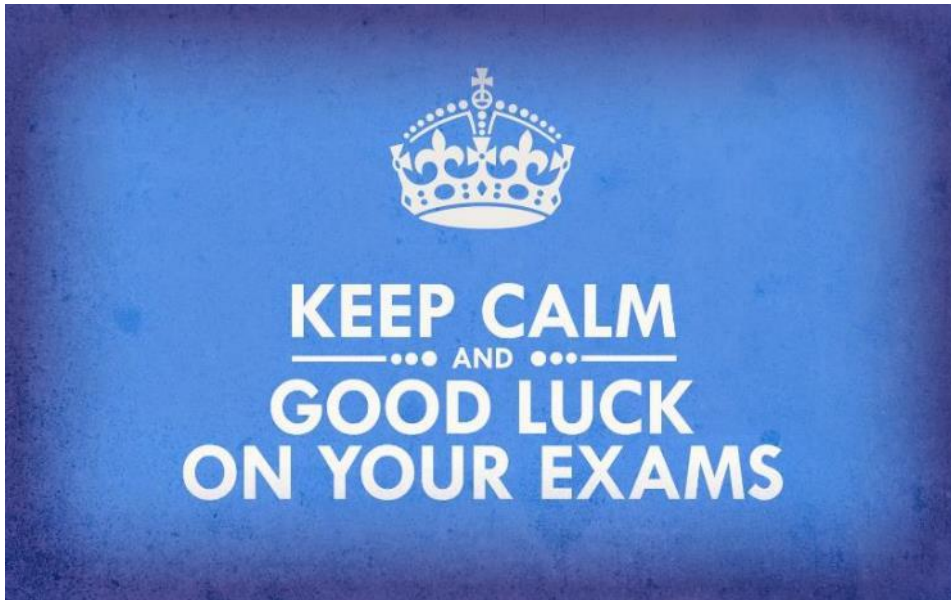

<https://toulawoss.blogspot.com>

- **Form**
 - Individuel mundtlig prøve.
 - Udgangspunkt i skriftlig opgave, men omfatter hele pensum.
 - Helhedsbedømmelse af skriftlig produkt og mundtlig præstation.
 - Ca. 20 minutter i alt inkl. votering:
 - Mulighed for max. 5 minutters oplæg fra studerende.
 - Ca. 10 minutter til dialog på baggrund af opgave, eventuelt oplæg og pensum i øvrigt.
 - Ca. 5 minutters votering og feedback.
 - Intern censur
- **Bedømmelse**
 - Vi bedømmer jer på opfyldelsen af læringsmål og anvendelse af pensum:
 - Ikke mere, ikke mindre!

2. SPØRGSMÅL TIL PENSUM



Ulrik Bisgaard Ulsrod Røhl AUTHOR | TEACHER

Created 24 Apr 11:27 | Posted 24 Apr 11:27

Sidste chance for spørgsmål: Hvad ønsker du, at Jacob & Ulrik fokuserer på?

Tirsdag 28. april kl. 9:50 - 10:35 har vi sidste forelæsning i IT-projektledelse. Vi håber I alle har fået med jer fra faget, og glæder os til at læse jeres opgaver.

Den sidste forelæsning har form som en onlinespørgetime, hvor I deltager via Teams, og kan stille spørgsmål til emner fra kurset, som I synes er uklare eller kræver uddybning.

I anvender dette link til at få adgang til spørgetimen: <https://teams.microsoft.com/meet/339448851300434?p=WPtrdua3S032l95h1c> ➦.

For at sikre, at der alle relevante spørgsmål så vidt muligt besvares, inviterer vi til at I nedenfor skriver spørgsmål og ønsker til emner, som vi så kan ta' udgangspunkt i. I er også meget velkomne til at 'like' eksisterende emner og spørgsmål, som I synes er relevante.

Reply



Anonymous 2n2h8

25 Apr 14:50

Skal man lave en teori- og metodedel?

← Reply | 👍 Like | ✉ Mark as unread



Anonymous 2n6bs

27 Apr 13:13

Er der et sted man kan se en oversigt over hvilke dele man skal fremlægge om til den mundtlige del? Skal man tage slides/modeller med til at tage udgangspunkt i?

← Reply | 👍 Like | ✉ Mark as unread

2 Replies
ANDRE SPØRGSMÅL?

3. EVALUERING

HJÆLP DE KOMMENDE GENERATIONER!

Husk at udfylde Evaluering senest søndag 7. juni

Find evalueringen på
<https://survey.cbs.dk>



<https://jasperfoto.dk/>

